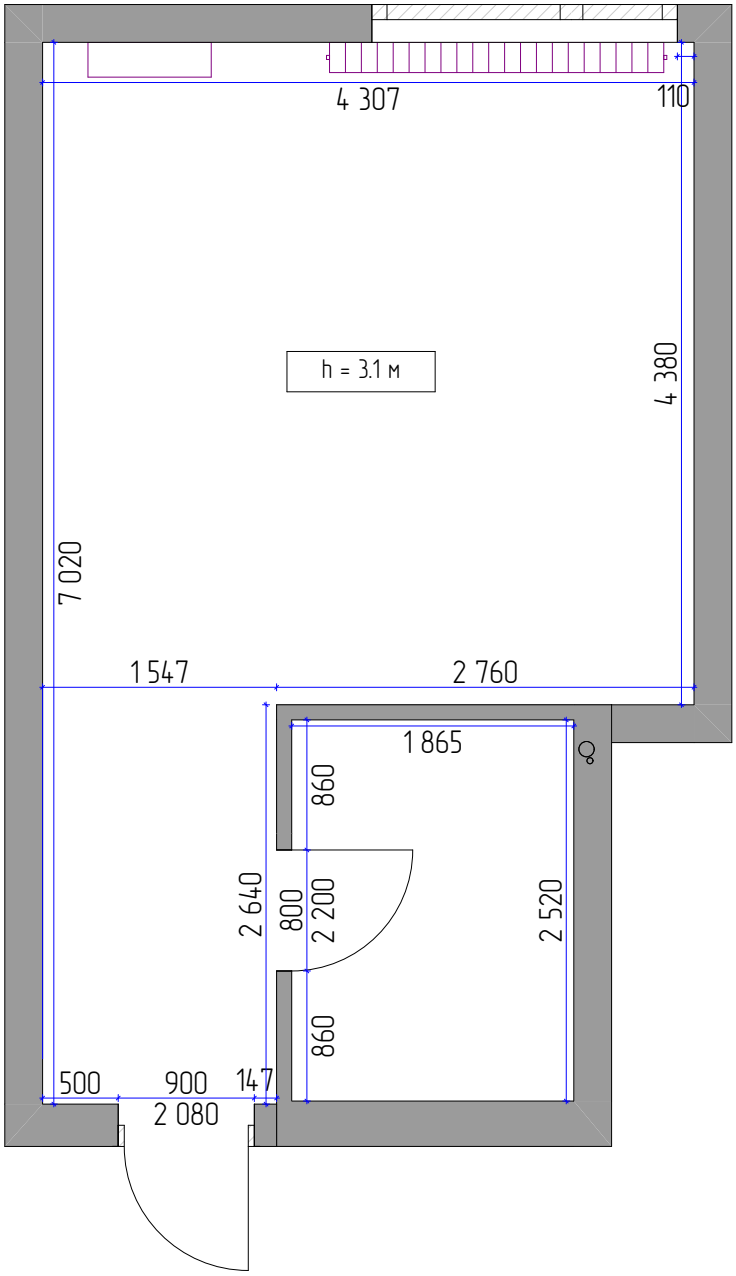


Условные обозначения:


– Стены

500 – Размер в мм

Примечание:

1. Все замеры произведены от черновых (неоштукатуренных) поверхностей стен и перегородок.
2. Приведенные размеры являются фактическими на момент фиксации. После выравнивания стен, штукатурных и отделочных работ (шпаклевка, плитка, стеновые панели) габариты помещений уменьшатся. Расчетная толщина слоя штукатурки и отделки в данном проекте условно принята за 20–30 мм на каждую стену.
3. Все критически важные размеры (для встроенной мебели, кухонных гарнитуров, инсталляций, дверных проемов и сантехнического оборудования) необходимо повторно проверить и уточнить по месту после завершения этапа оштукатуривания и выравнивания стен.
4. Все выводы инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция, электрика) привязаны к черновым стенам. Строительной бригаде необходимо учесть толщину будущего финишного слоя при монтаже оконечных устройств и сантехники.
5. В ходе демонтажных или подготовительных работ параметры помещений (высоты, углы, геометрия) могут измениться. При обнаружении значительных расхождений с данным планом (более 15–20 мм) необходимо незамедлительно уведомить автора проекта для внесения корректировок.

Масштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	Обмерный план	Лист
		3
		Дата
		15.10.26

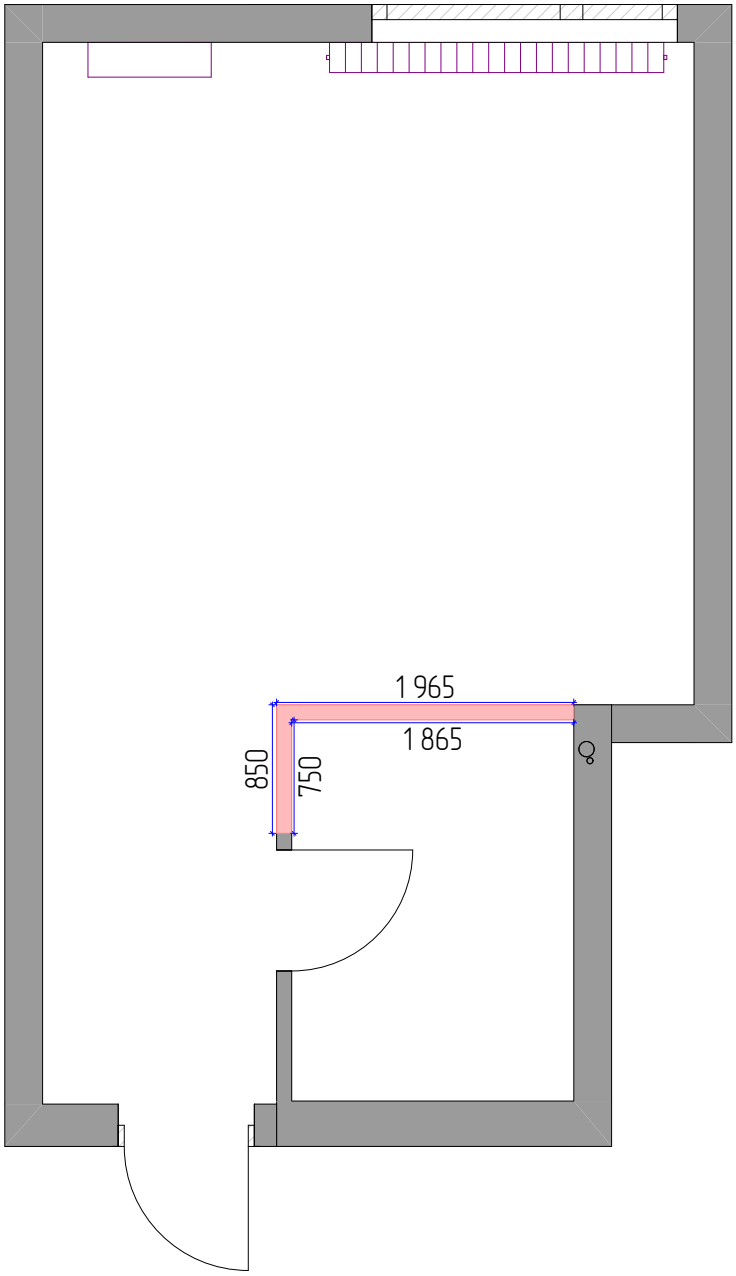

Условные обозначения:


– Сохраняемая конструкция


500 – Размер в мм

– Демонтируемые элементы


Примечание:

1. Демонтаж перегородок производить строго в соответствии с выделенной на плане зоной (выделена бледно красным цветом).
2. Перед началом работ полностью обесточить все кабельные линии, проходящие по демонтируемой стене, и перекрыть локальные инженерные выводы (при наличии).
3. Демонтаж выполнять аккуратным ручным или механизированным способом, исключающим повреждение несущих строительных конструкций здания, общего контура пола и потолка.
4. Строительный мусор подлежит обязательной упаковке в мешки и своевременному вывозу с объекта. Складирование мусора на междуэтажных перекрытиях сверх допустимых нагрузок строго запрещено.

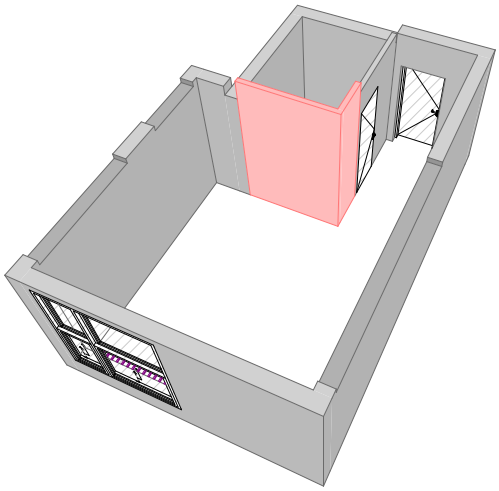

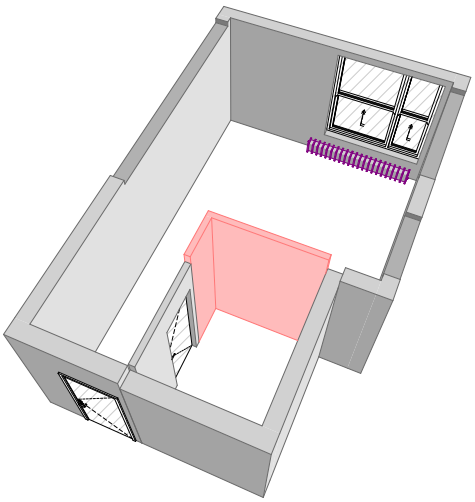

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План демонтажных работ	Лист 4
		Дата 15.10.26

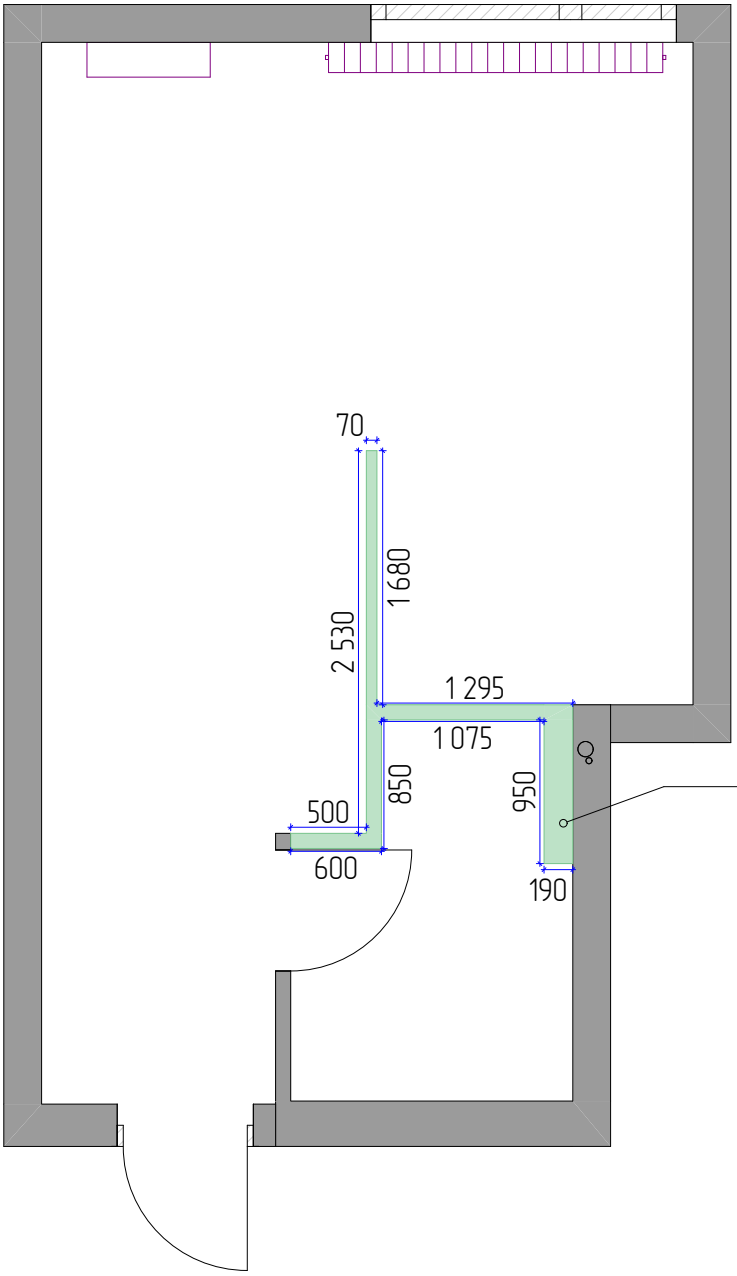

Условные обозначения:


– Стены


500 – Размер в мм


– Монтируемые элементы

Примечание:


1. Возведение новых перегородок (выделены зеленым цветом) осуществлять строго по указанным привязкам от капитальных стен здания.
2. При кладке перегородок обеспечить обязательное армирование каждые 2–3 ряда и демпферное примыкание к плитам перекрытия (потолку).
3. Короб для скрытой инсталляции подвесного унитаза смонтировать на высоту h = 1200 мм от уровня будущего чистого пола. Глубину короба выдержать ровно 200 мм. Перед зашивкой короба влагостойким ГКЛ в два слоя составить акт скрытых работ на надежность крепления рамы инсталляции к полу и капитальной стене.
4. Все углы в зоне сопряжения возводимых стен санузла (особенно в зоне душевой кабины и инсталляции) вывести строго под 90°.

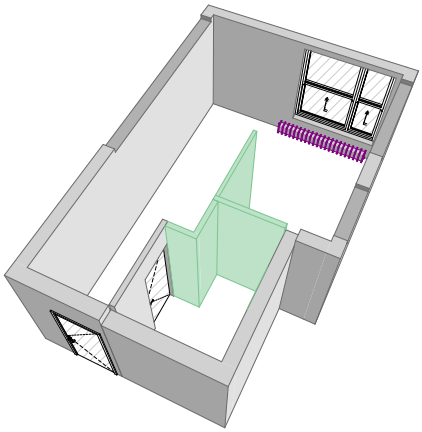

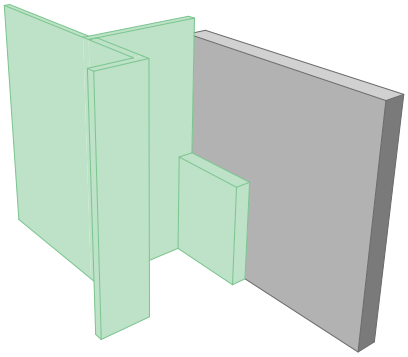

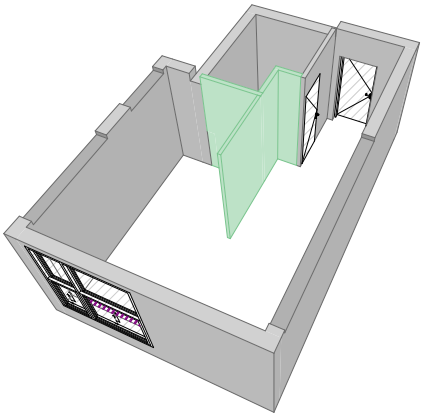

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	План монтажных работ	Лист 5
		Дата 15.10.26

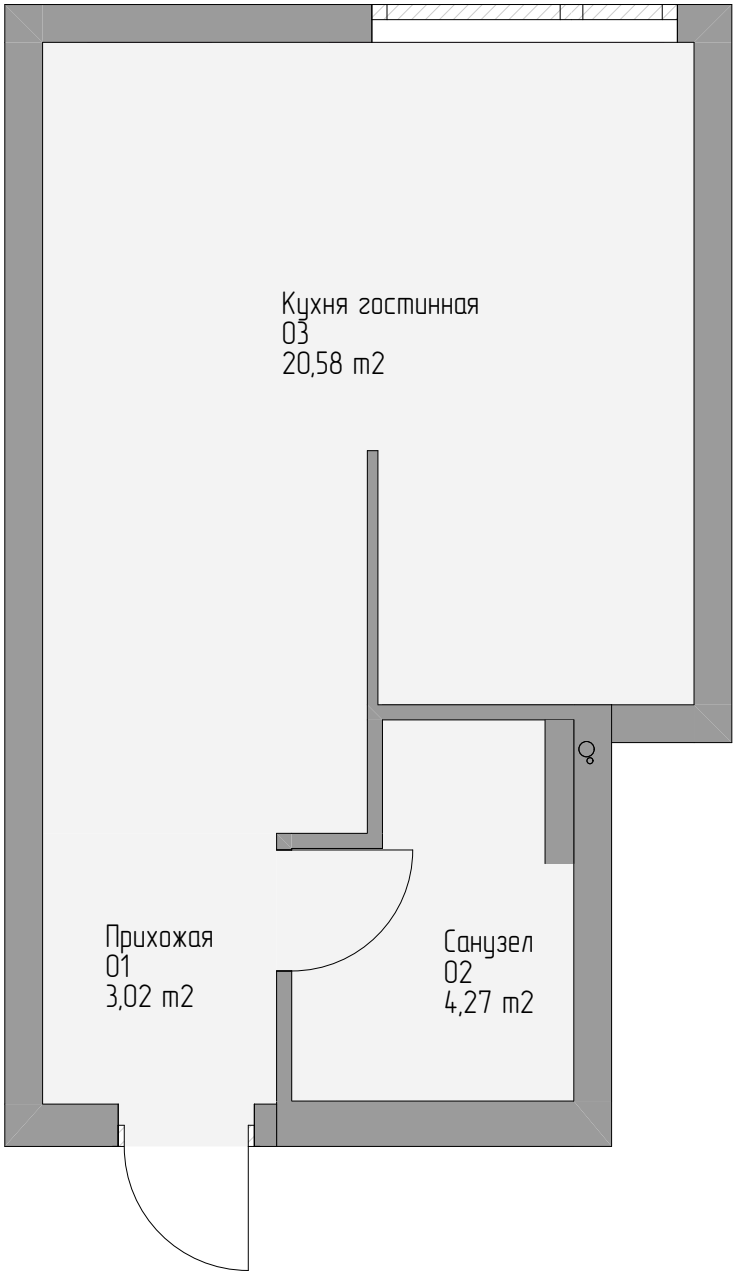

Условные обозначения:

– Стены

500 – Размер в мм

Примечание:

1. Все замеры произведены от черновых (неоштукатуренных) поверхностей стен и перегородок.
2. Приведенные размеры являются фактическими на момент фиксации. После выравнивания стен, штукатурных и отделочных работ (шпаклевка, плитка, стеновые панели) габариты помещений уменьшатся. Расчетная толщина слоя штукатурки и отделки в данном проекте условно принята за 20–30 мм на каждую стену.
3. Все критически важные размеры (для встроенной мебели, кухонных гарнитуров, инсталляций, дверных проемов и сантехнического оборудования) необходимо повторно проверить и уточнить по месту после завершения этапа оштукатуривания и выравнивания стен.
4. Все выводы инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция, электрика) привязаны к черновым стенам. Строительной бригаде необходимо учесть толщину будущего финишного слоя при монтаже оконечных устройств и сантехники.
5. В ходе демонтажных или подготовительных работ параметры помещений (высоты, углы, геометрия) могут измениться. При обнаружении значительных расхождений с данным планом (более 15–20 мм) необходимо незамедлительно уведомить автора проекта для внесения корректировок.

№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	3,02
02	Санузел	4,27
03	Кухня гостинная	20,58
		27,87 м²

Маштаб 1:50	Москва студия 27.8 м. кв.	
	Экспликация	Лист
		6
		Дата
		15.10.26
